




**FASE 0**  
Stato di fatto  
Esecuzione BOE

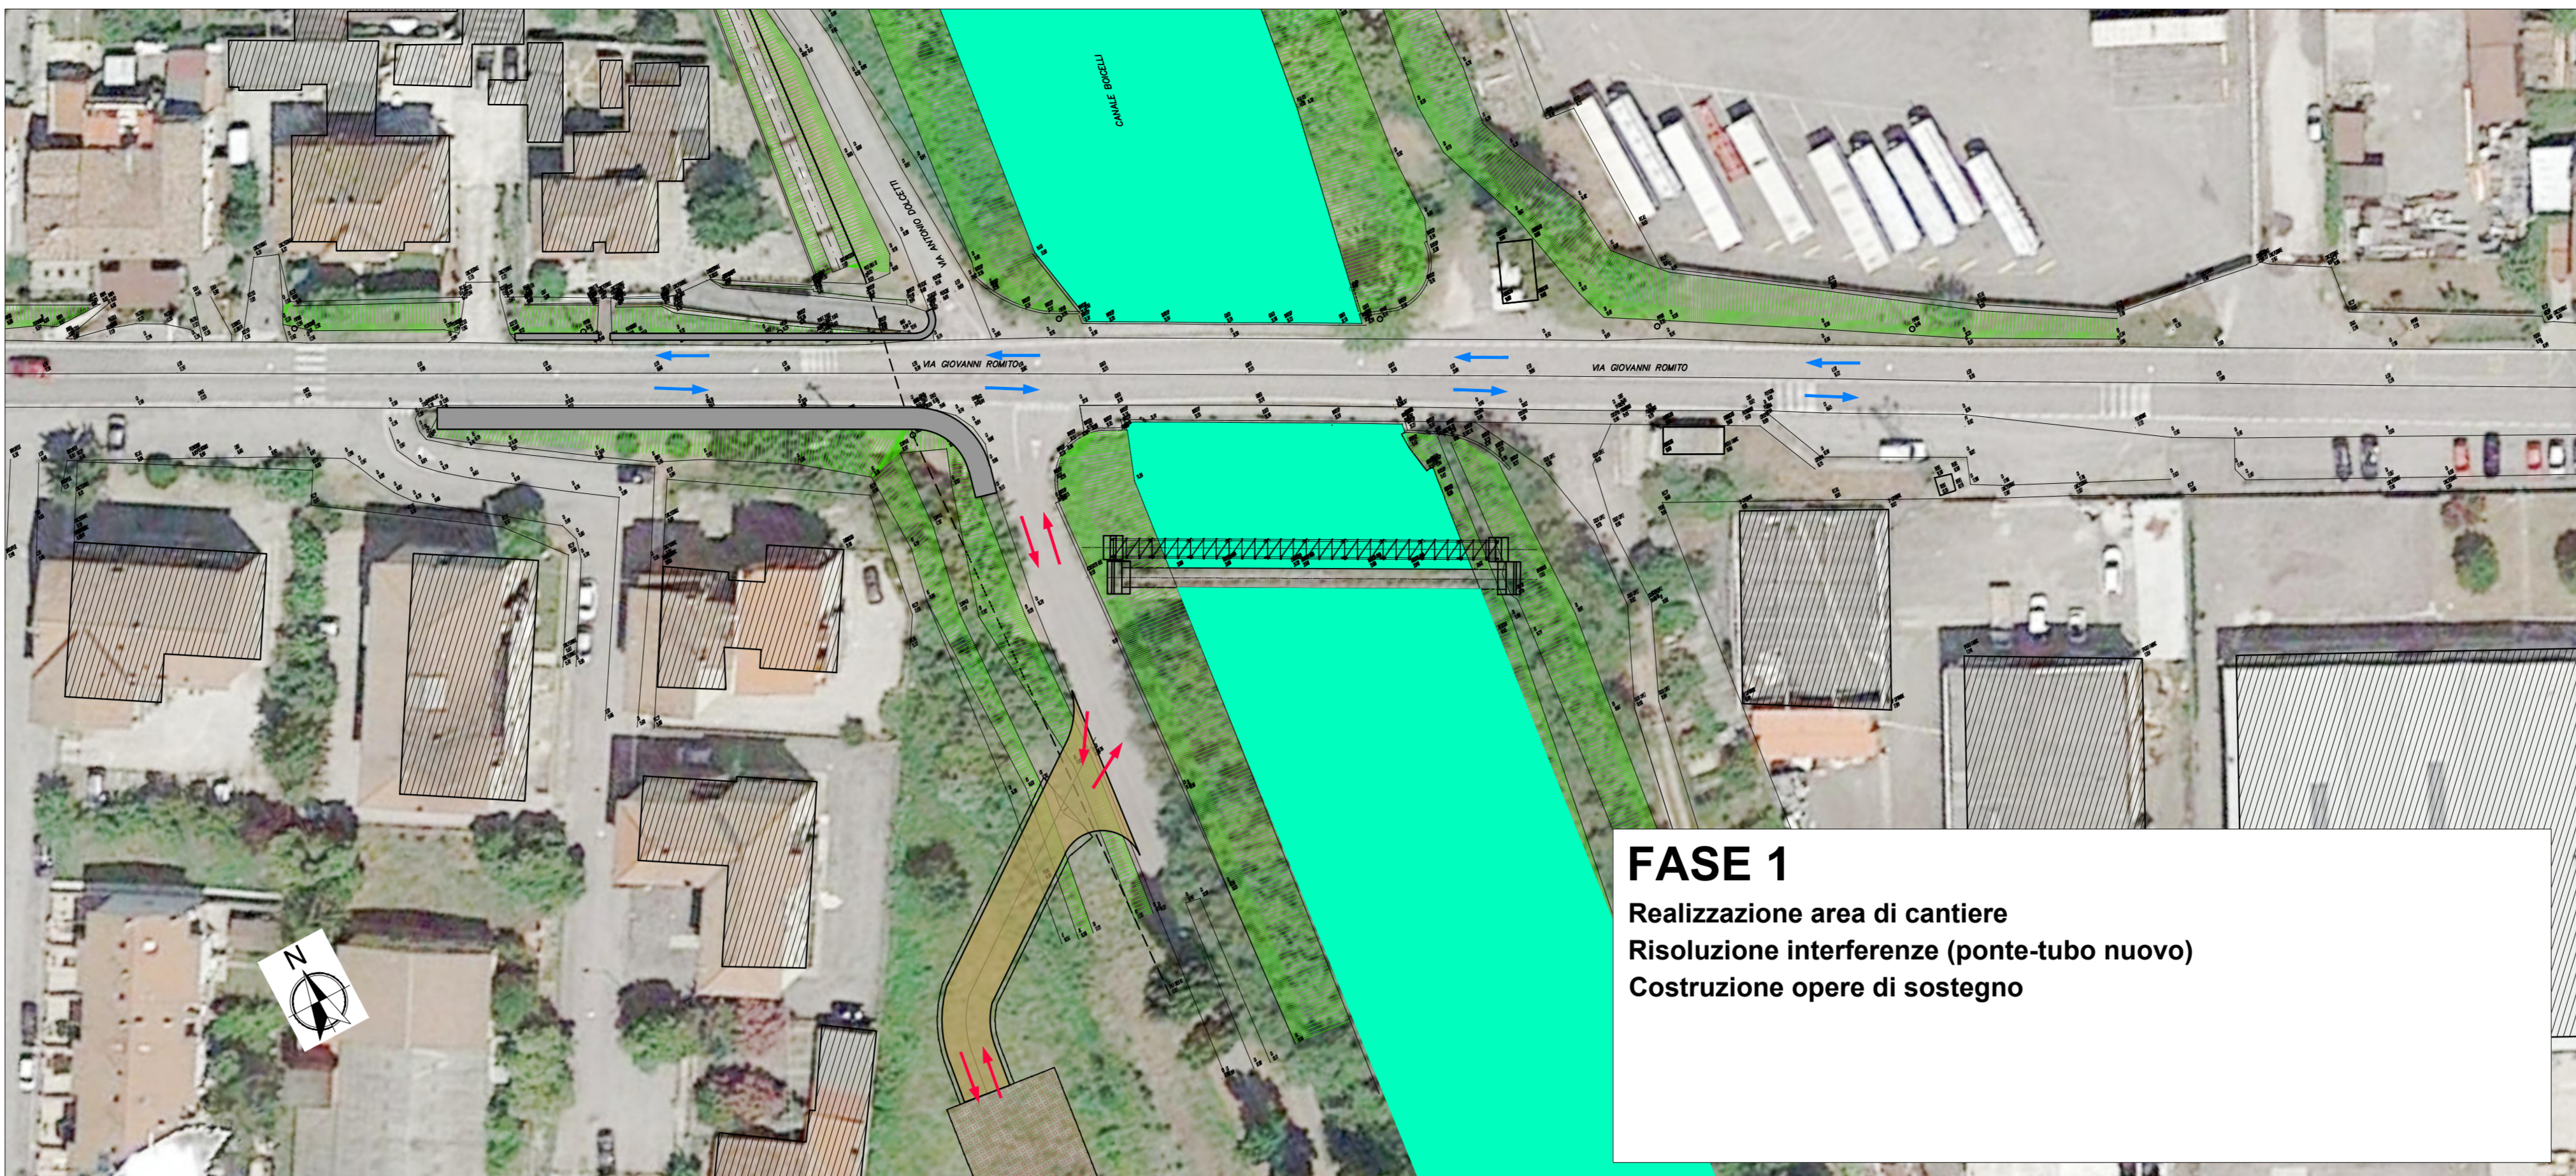


**FASE 1**  
Realizzazione area di cantiere  
Risoluzione interferenze (ponte-tubo nuovo)  
Costruzione opere di sostegno

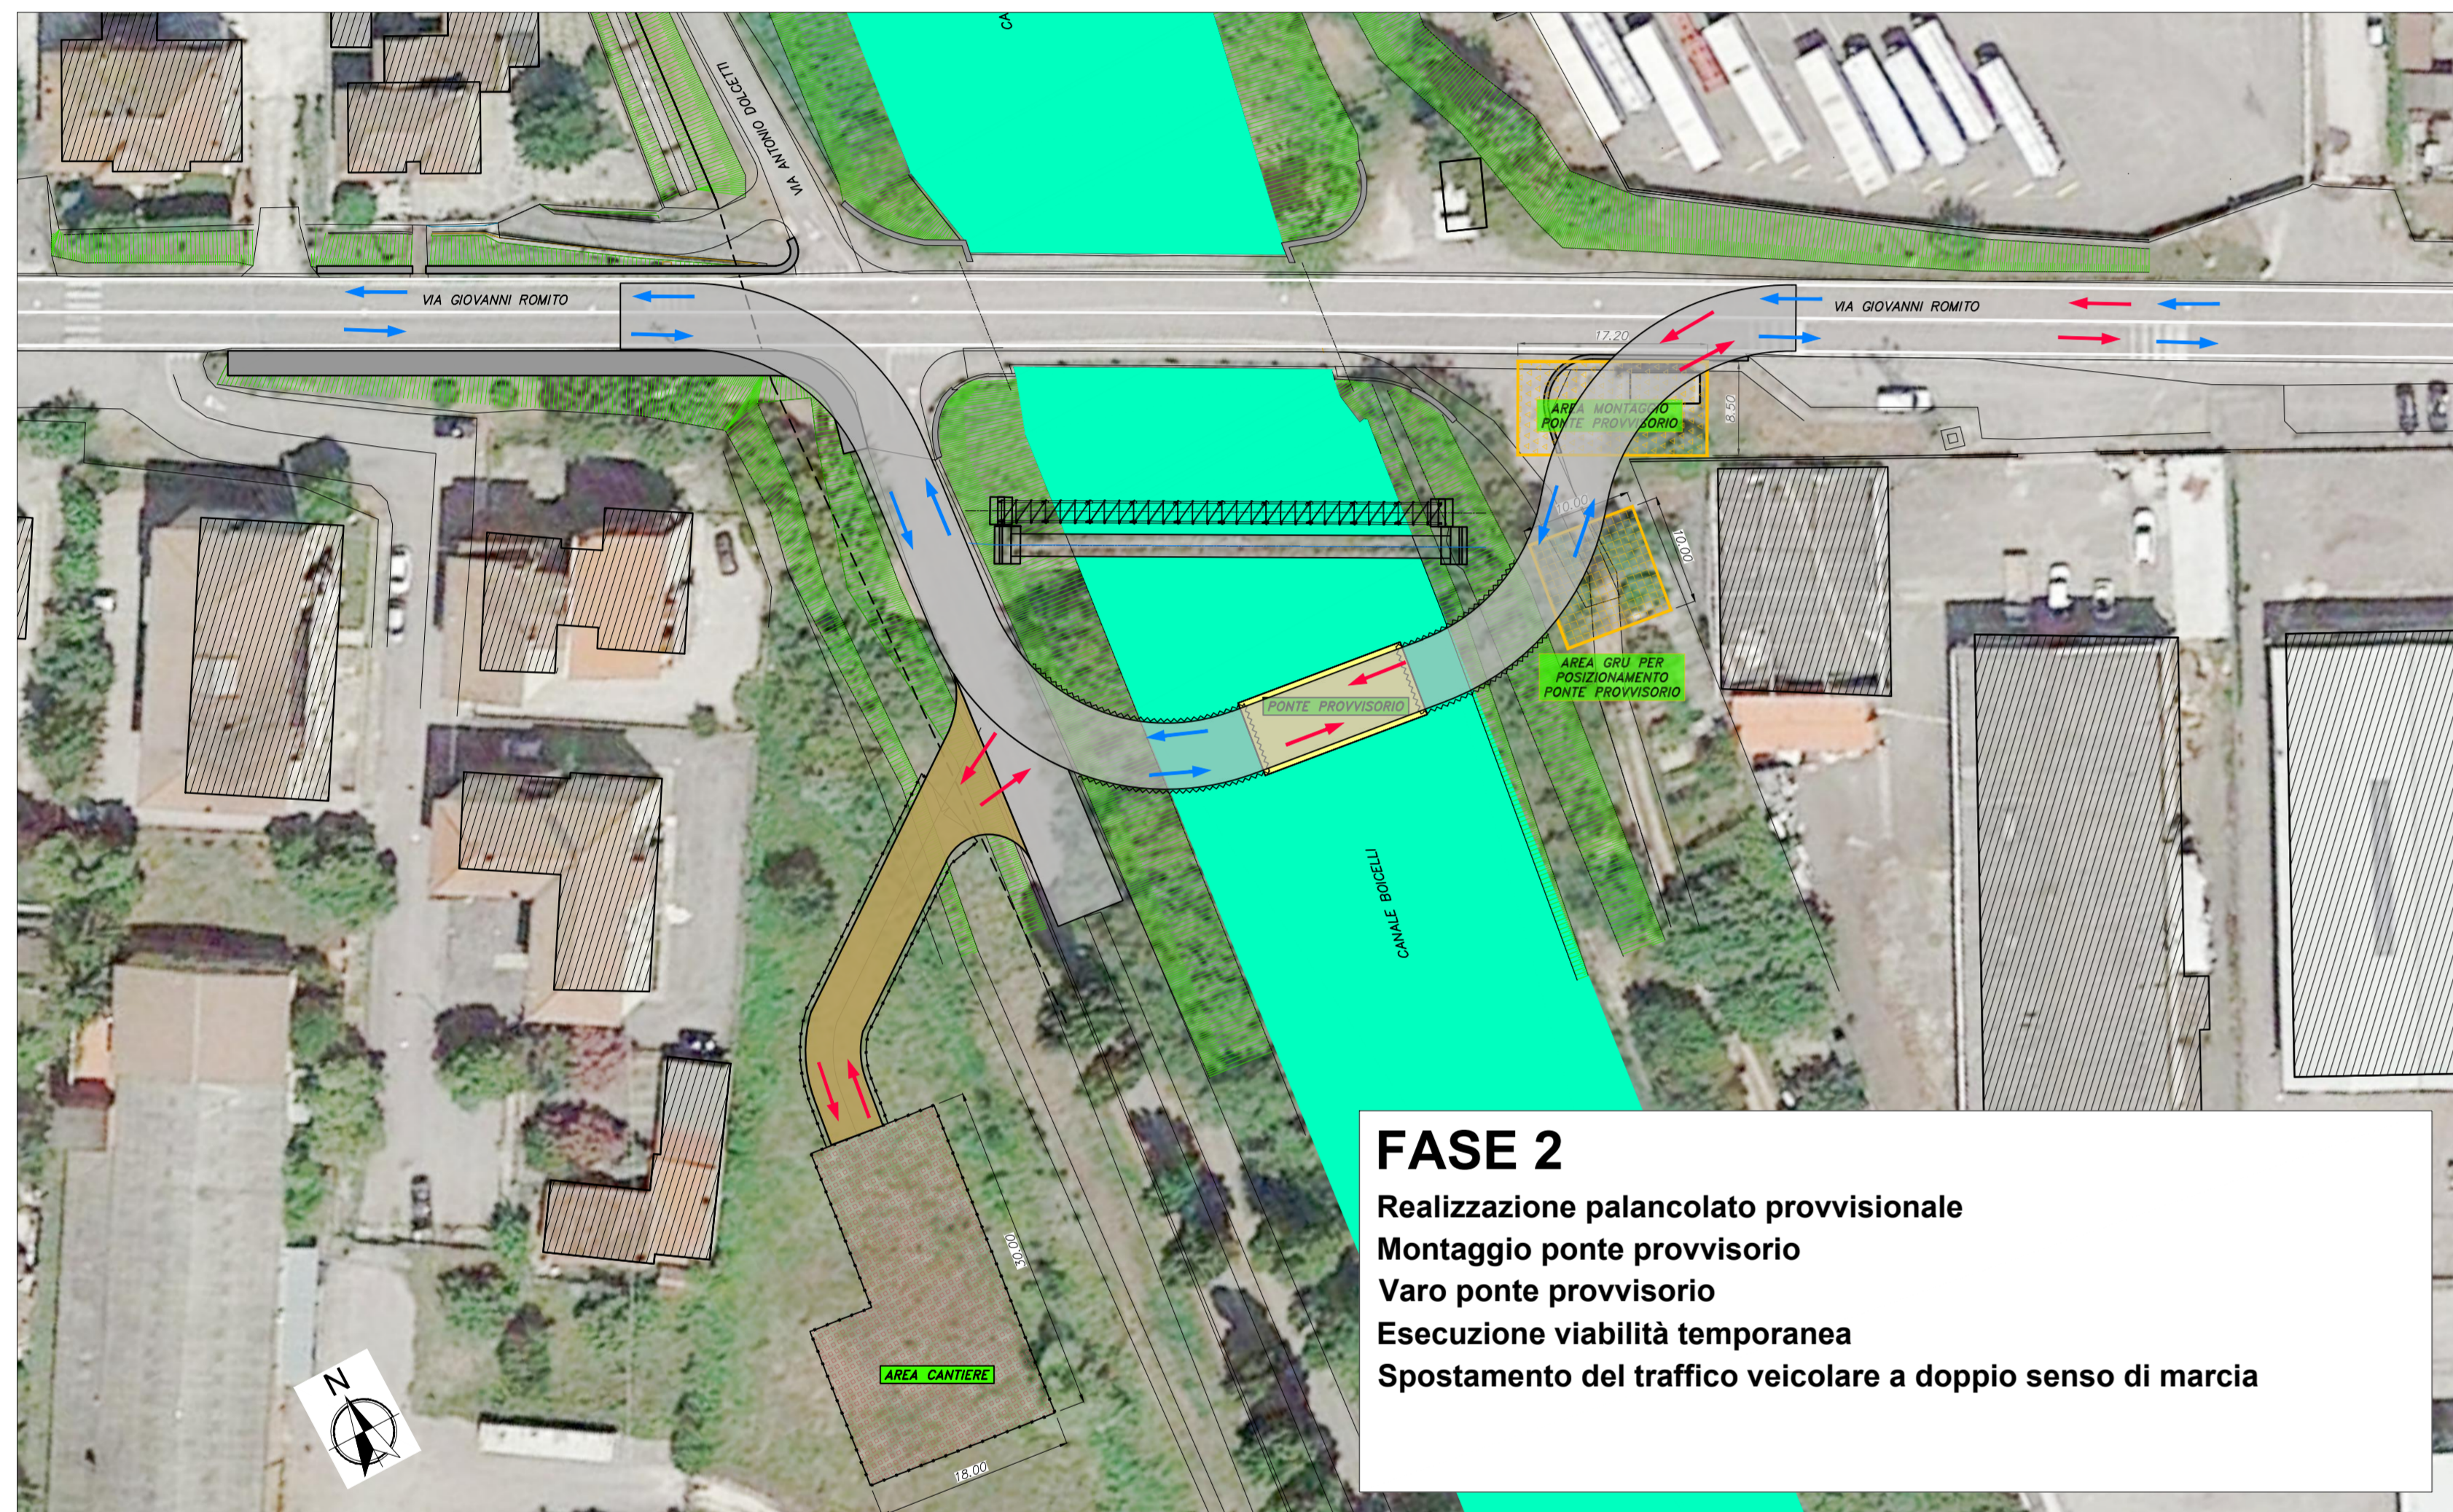


**FASE 2**  
Realizzazione palancolato provvisorio  
Montaggio ponte provvisorio  
Varo ponte provvisorio  
Esecuzione viabilità temporanea  
Spostamento del traffico veicolare a doppio senso di marcia

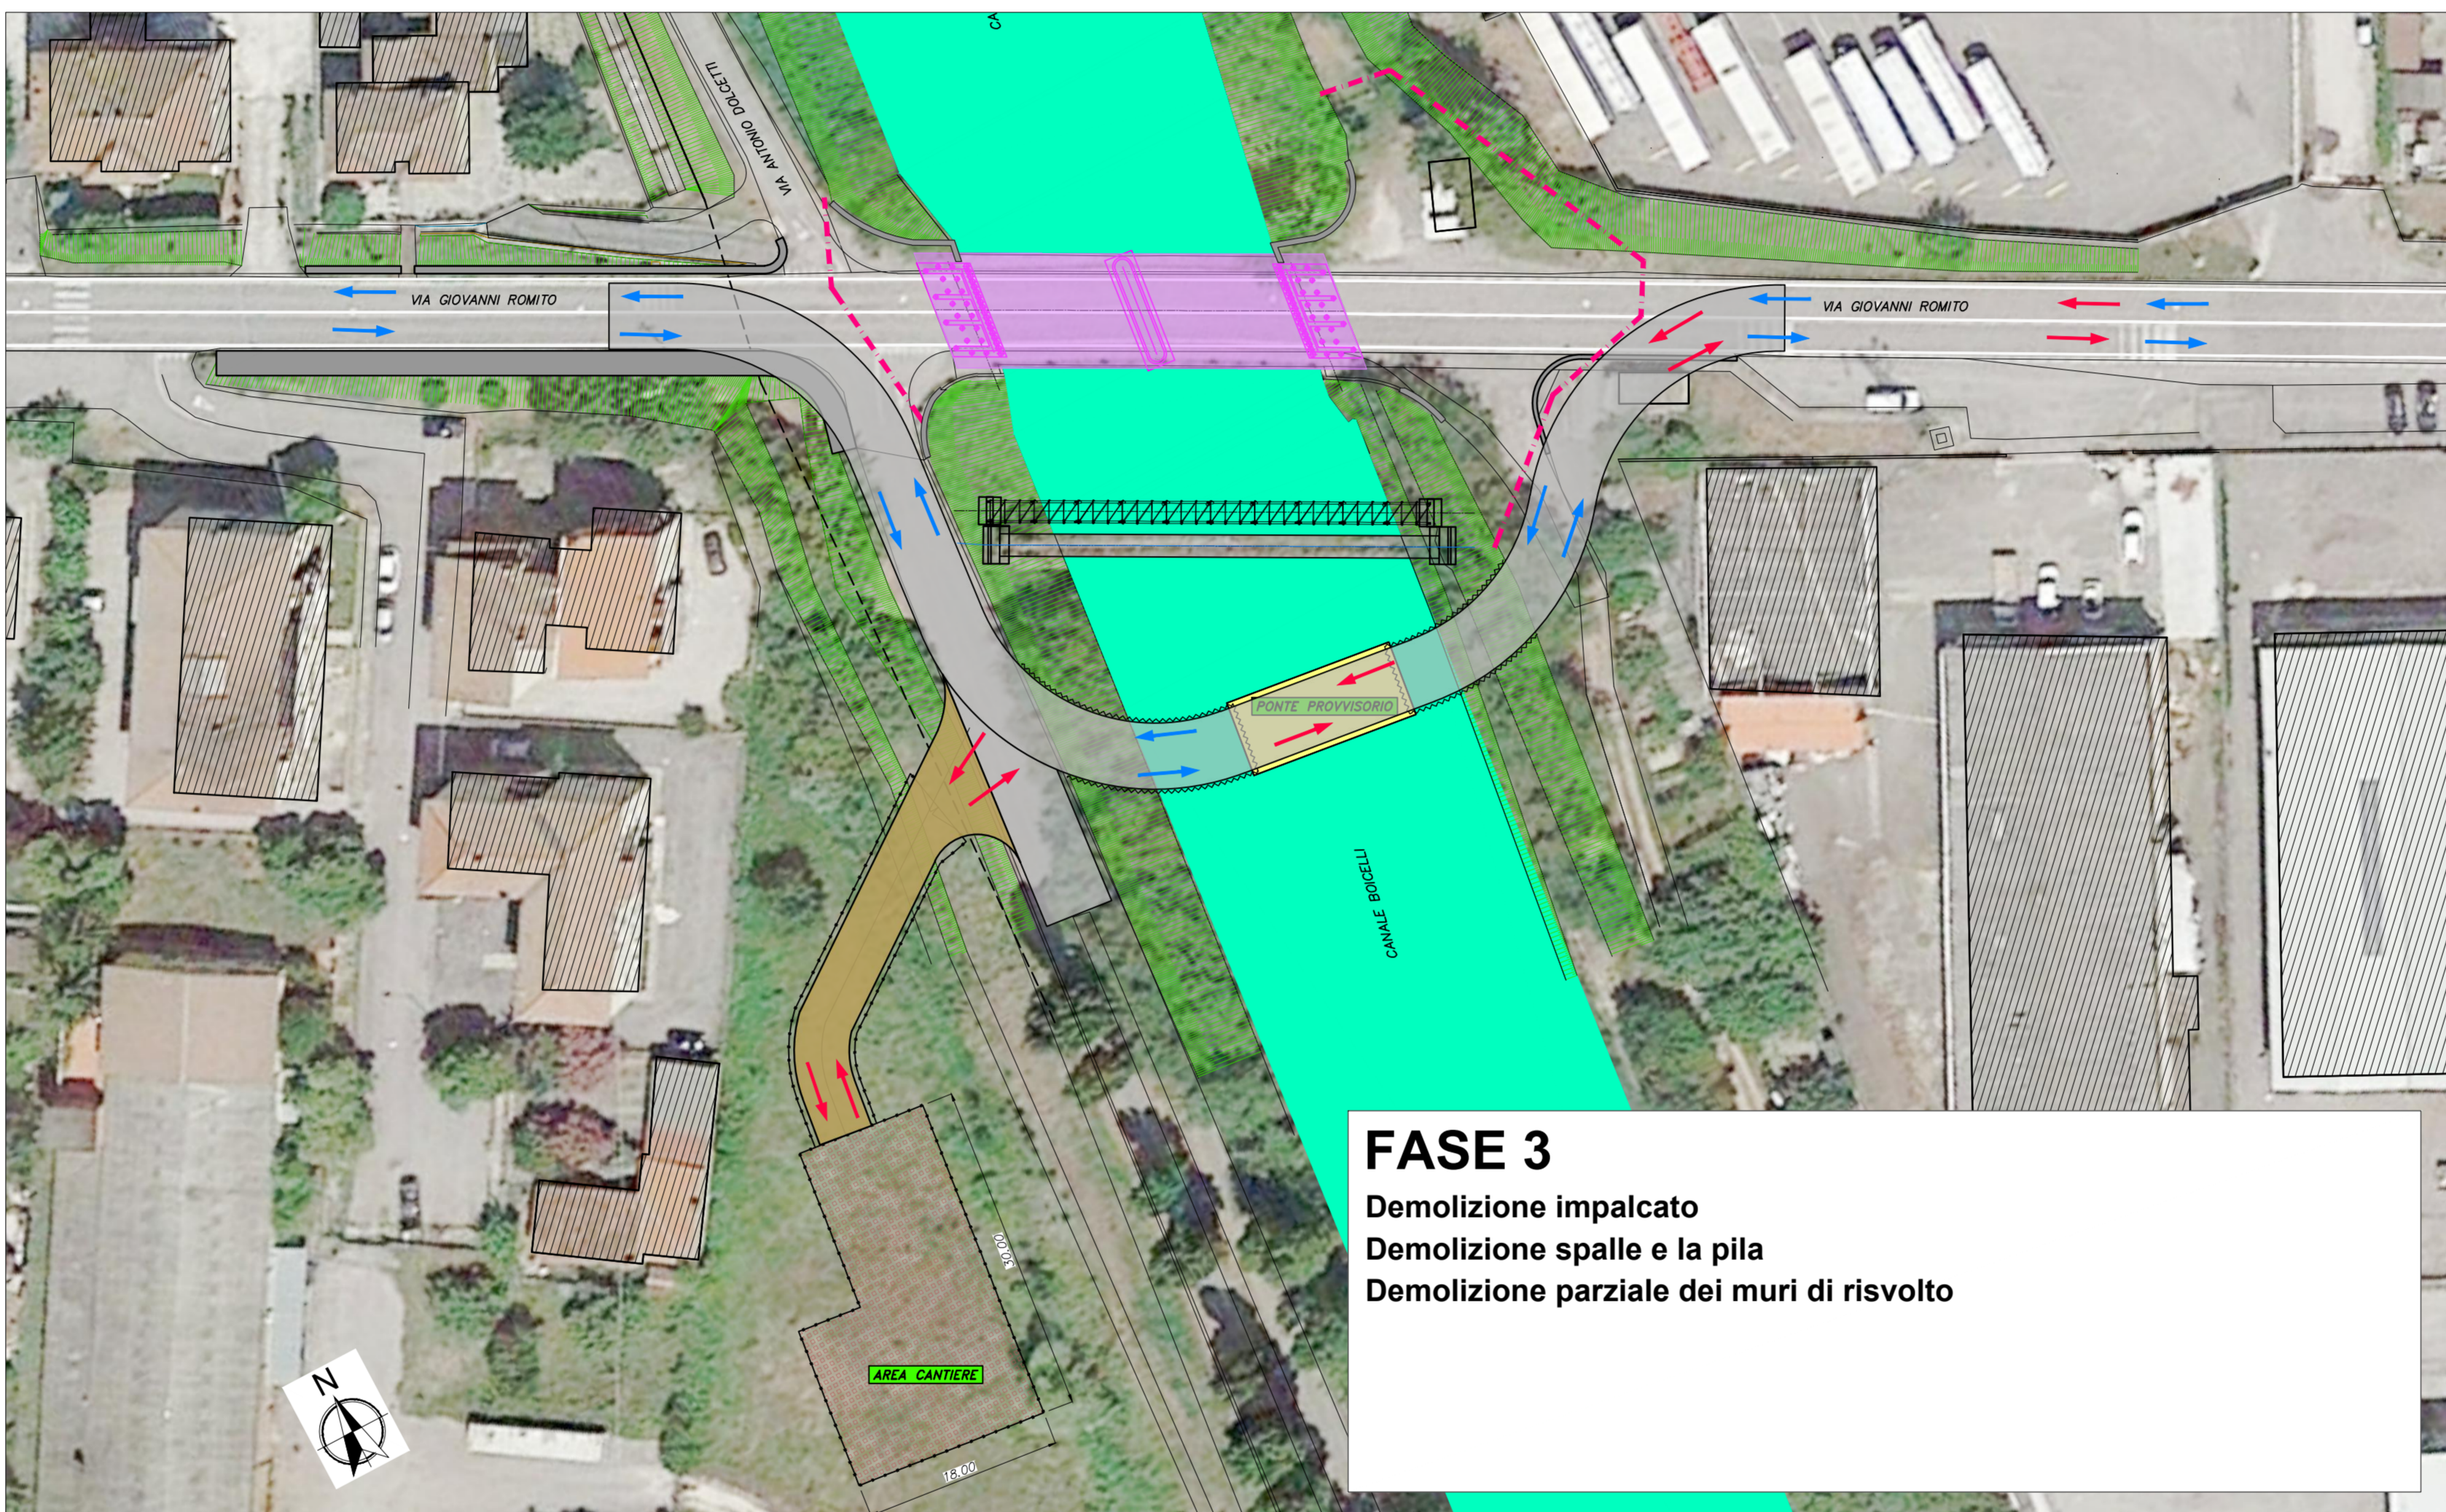


**FASE 3**  
Demolizione impalcato  
Demolizione spalle e la pila  
Demolizione parziale dei muri di risvolto

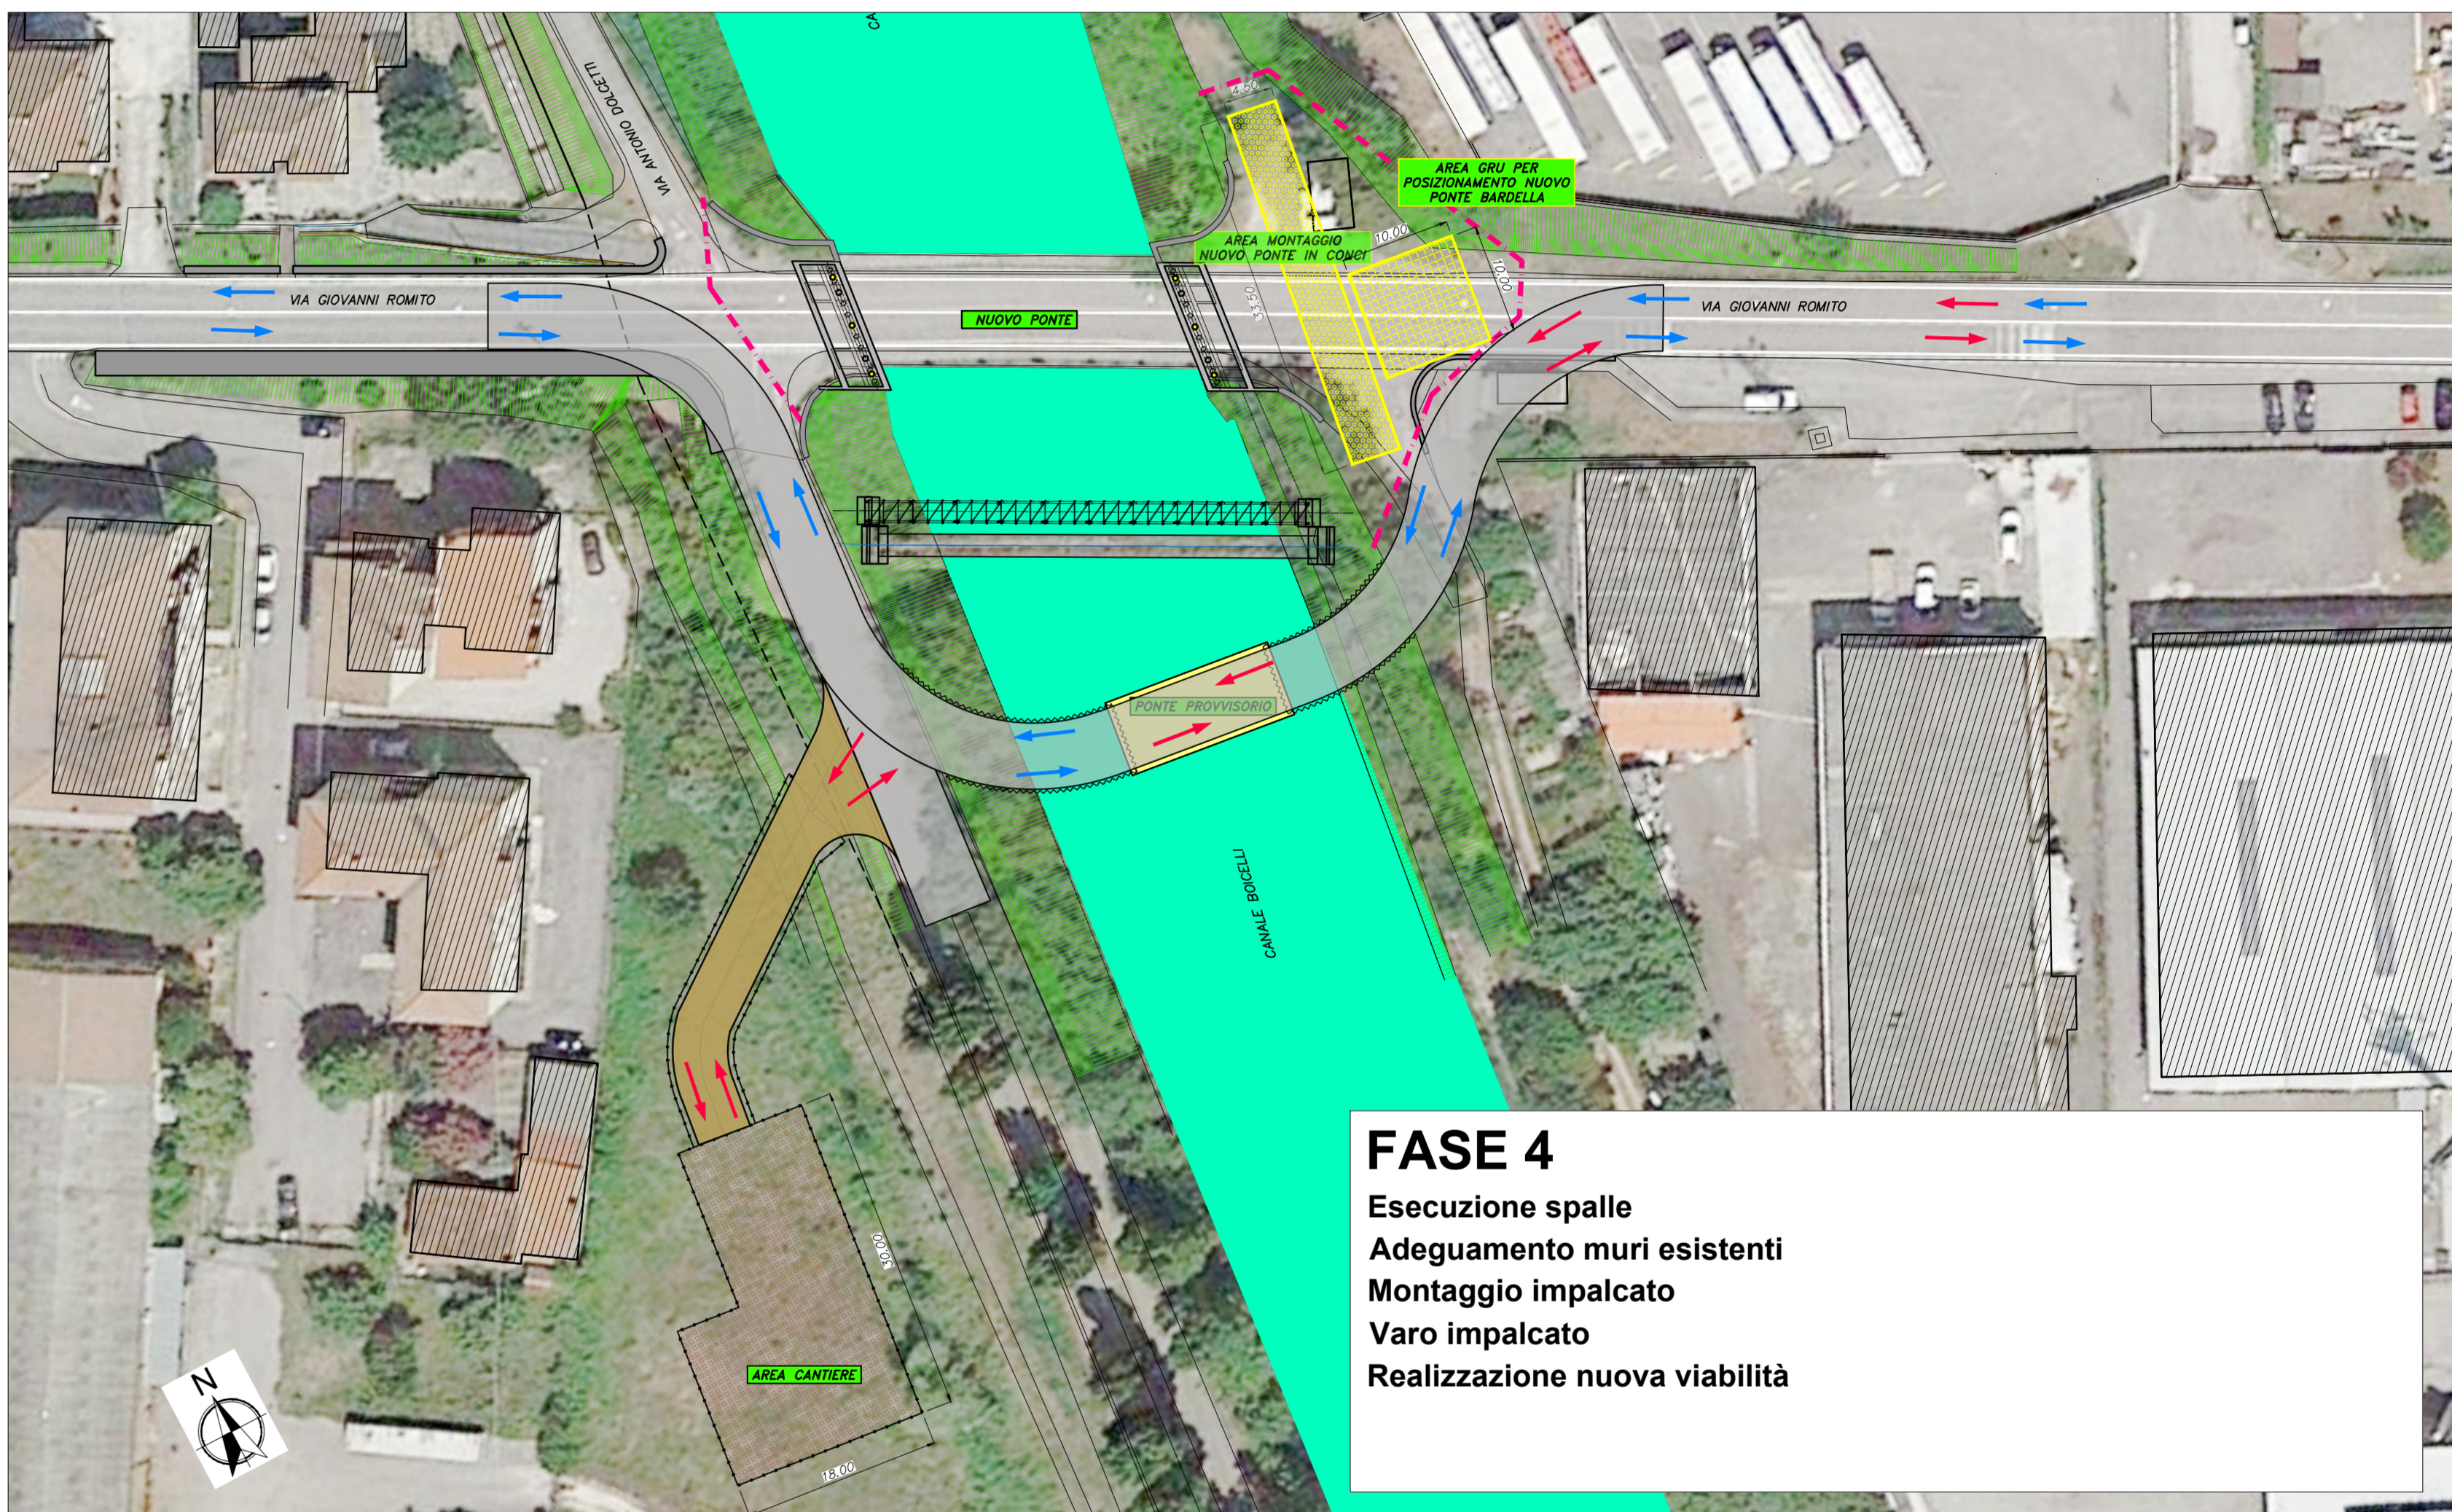

**FASE 4**  
Esecuzione spalle  
Adegumento muri esistenti  
Montaggio impalcato  
Varo impalcato  
Realizzazione nuova viabilità

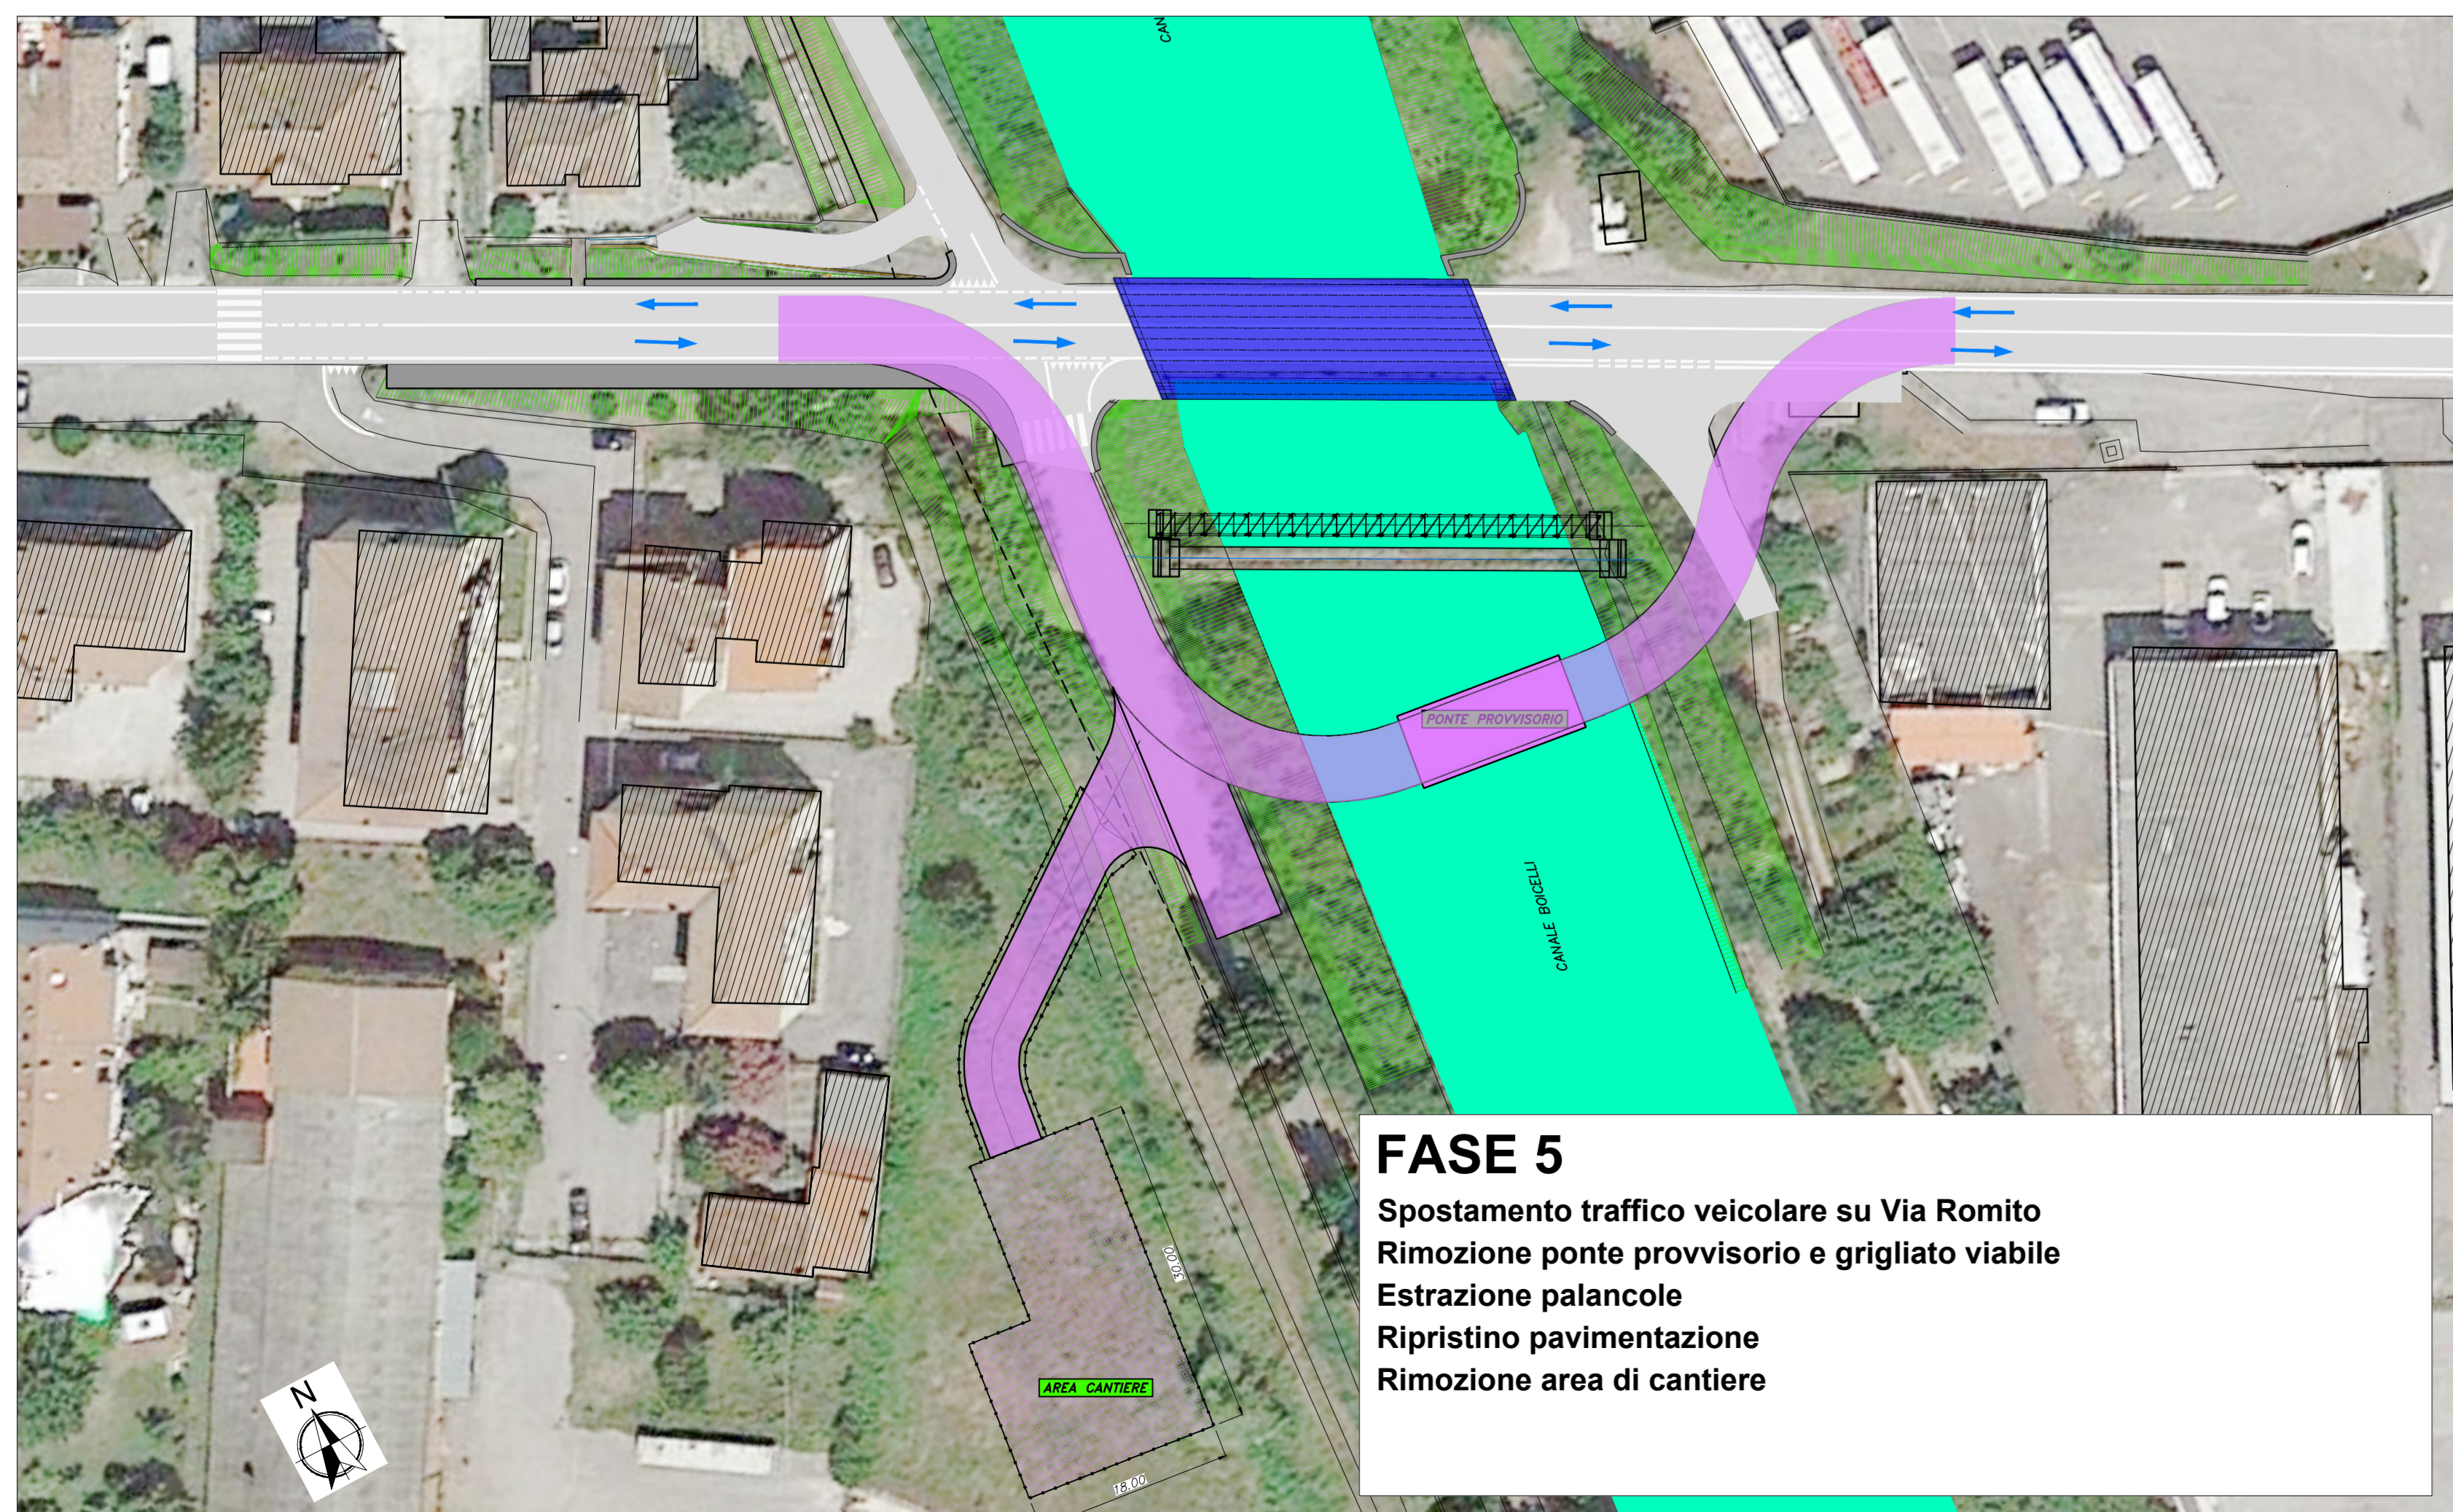

**FASE 5**  
Spostamento traffico veicolare su Via Romito  
Rimozione ponte provvisorio e grigliato viabile  
Estrazione palancole  
Ripristino pavimentazione  
Rimozione area di cantiere

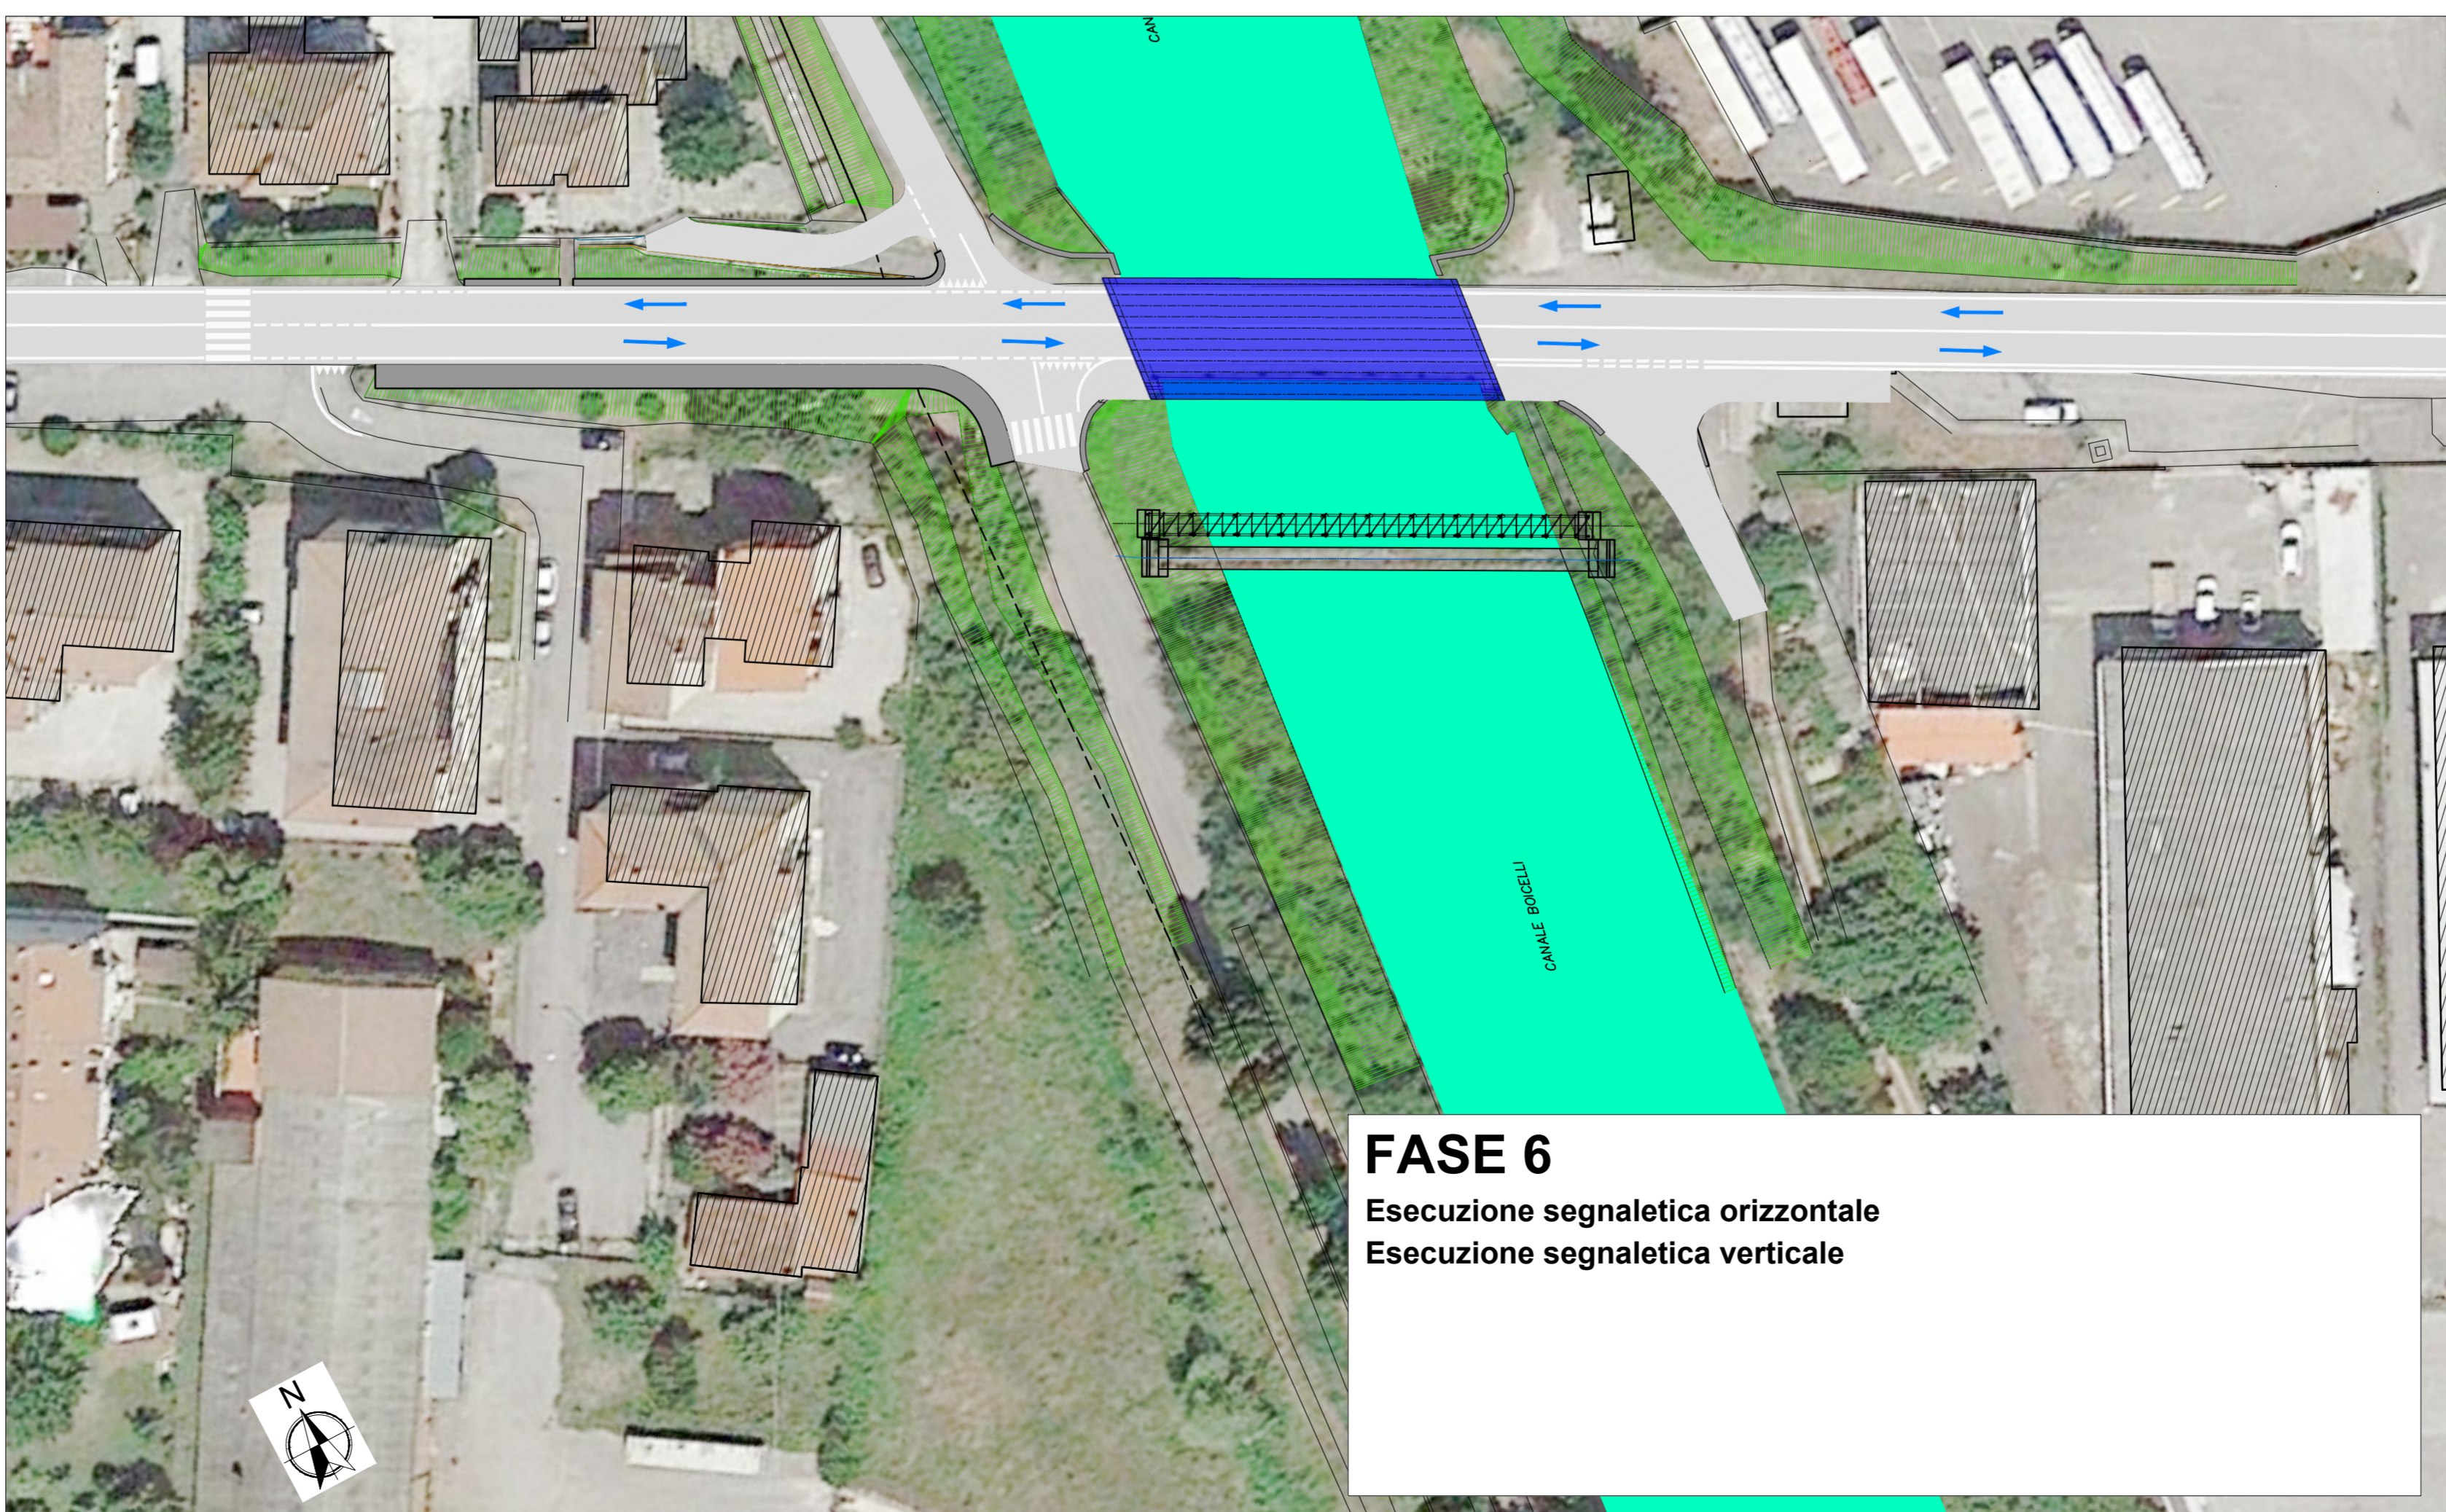

**FASE 6**  
Esecuzione segnaletica orizzontale  
Esecuzione segnaletica verticale

**LEGENDA**

- Area di cantiere
- Pista accesso cantiere
- Viabilità provvisoria
- Ponte viabilità provvisoria
- Cantiere montaggio ponte viabilità provvisoria
- Cantiere montaggio nuovo ponte bardella
- Nuovo ponte Bardella
- Demolizioni o rimozioni
- Percorsi mezzi di cantiere
- Percorsi viabilità ordinaria
- Delimitazione aree di lavorazioni
- Nuovi muri
- T.O.C.
- Palancole per realizzazione viabilità provvisoria

**Regione Emilia-Romagna**  
Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

**PROGETTO EUROPEO "INIWAS"**  
ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO DI V CLASSE EUROPEA I LOTTO/1 STRALCIO/PARTE

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE BARDELLA SUL CANALE BOICELLI

PROGETTO ESECUTIVO

RUP: Dott. Claudio Miccoli

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTO: Dott. Ing. Stefano Cassarini



GRUPPO DI LAVORO:  
Siges s.r.l.  
Dott. Ing. M. Bolognesi  
Dott. Ing. M. Baratta  
Geom. R. Marini  
Studio tecnico Vtali  
Geom. G.P. Vtali  
SOCOTEC Italia s.r.l.  
Dott. Geol. G. Ferioli

TITOLO: Piano di Sicurezza - Fasi di cantiere

ELABORATO:

E.3.2

REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
0	02/09/2019	PROGETTO	M. BARATTA	G.P. VTALI	C. MICCOLI	1:1000
1	02/09/2019	MODIFICAZIONE	M. BARATTA	G.P. VTALI	C. MICCOLI	1:1000
2	02/09/2019	MODIFICAZIONE	M. BARATTA	G.P. VTALI	C. MICCOLI	1:1000
3	02/09/2019	MODIFICAZIONE	M. BARATTA	G.P. VTALI	C. MICCOLI	1:1000
4	02/09/2019	MODIFICAZIONE	M. BARATTA	G.P. VTALI	C. MICCOLI	1:1000

Ogni riproduzione, utilizzazione o cessione del presente disegno a terzi senza autorizzazione è punibile penalmente secondo i termini di legge.
